


発生源対策地区図

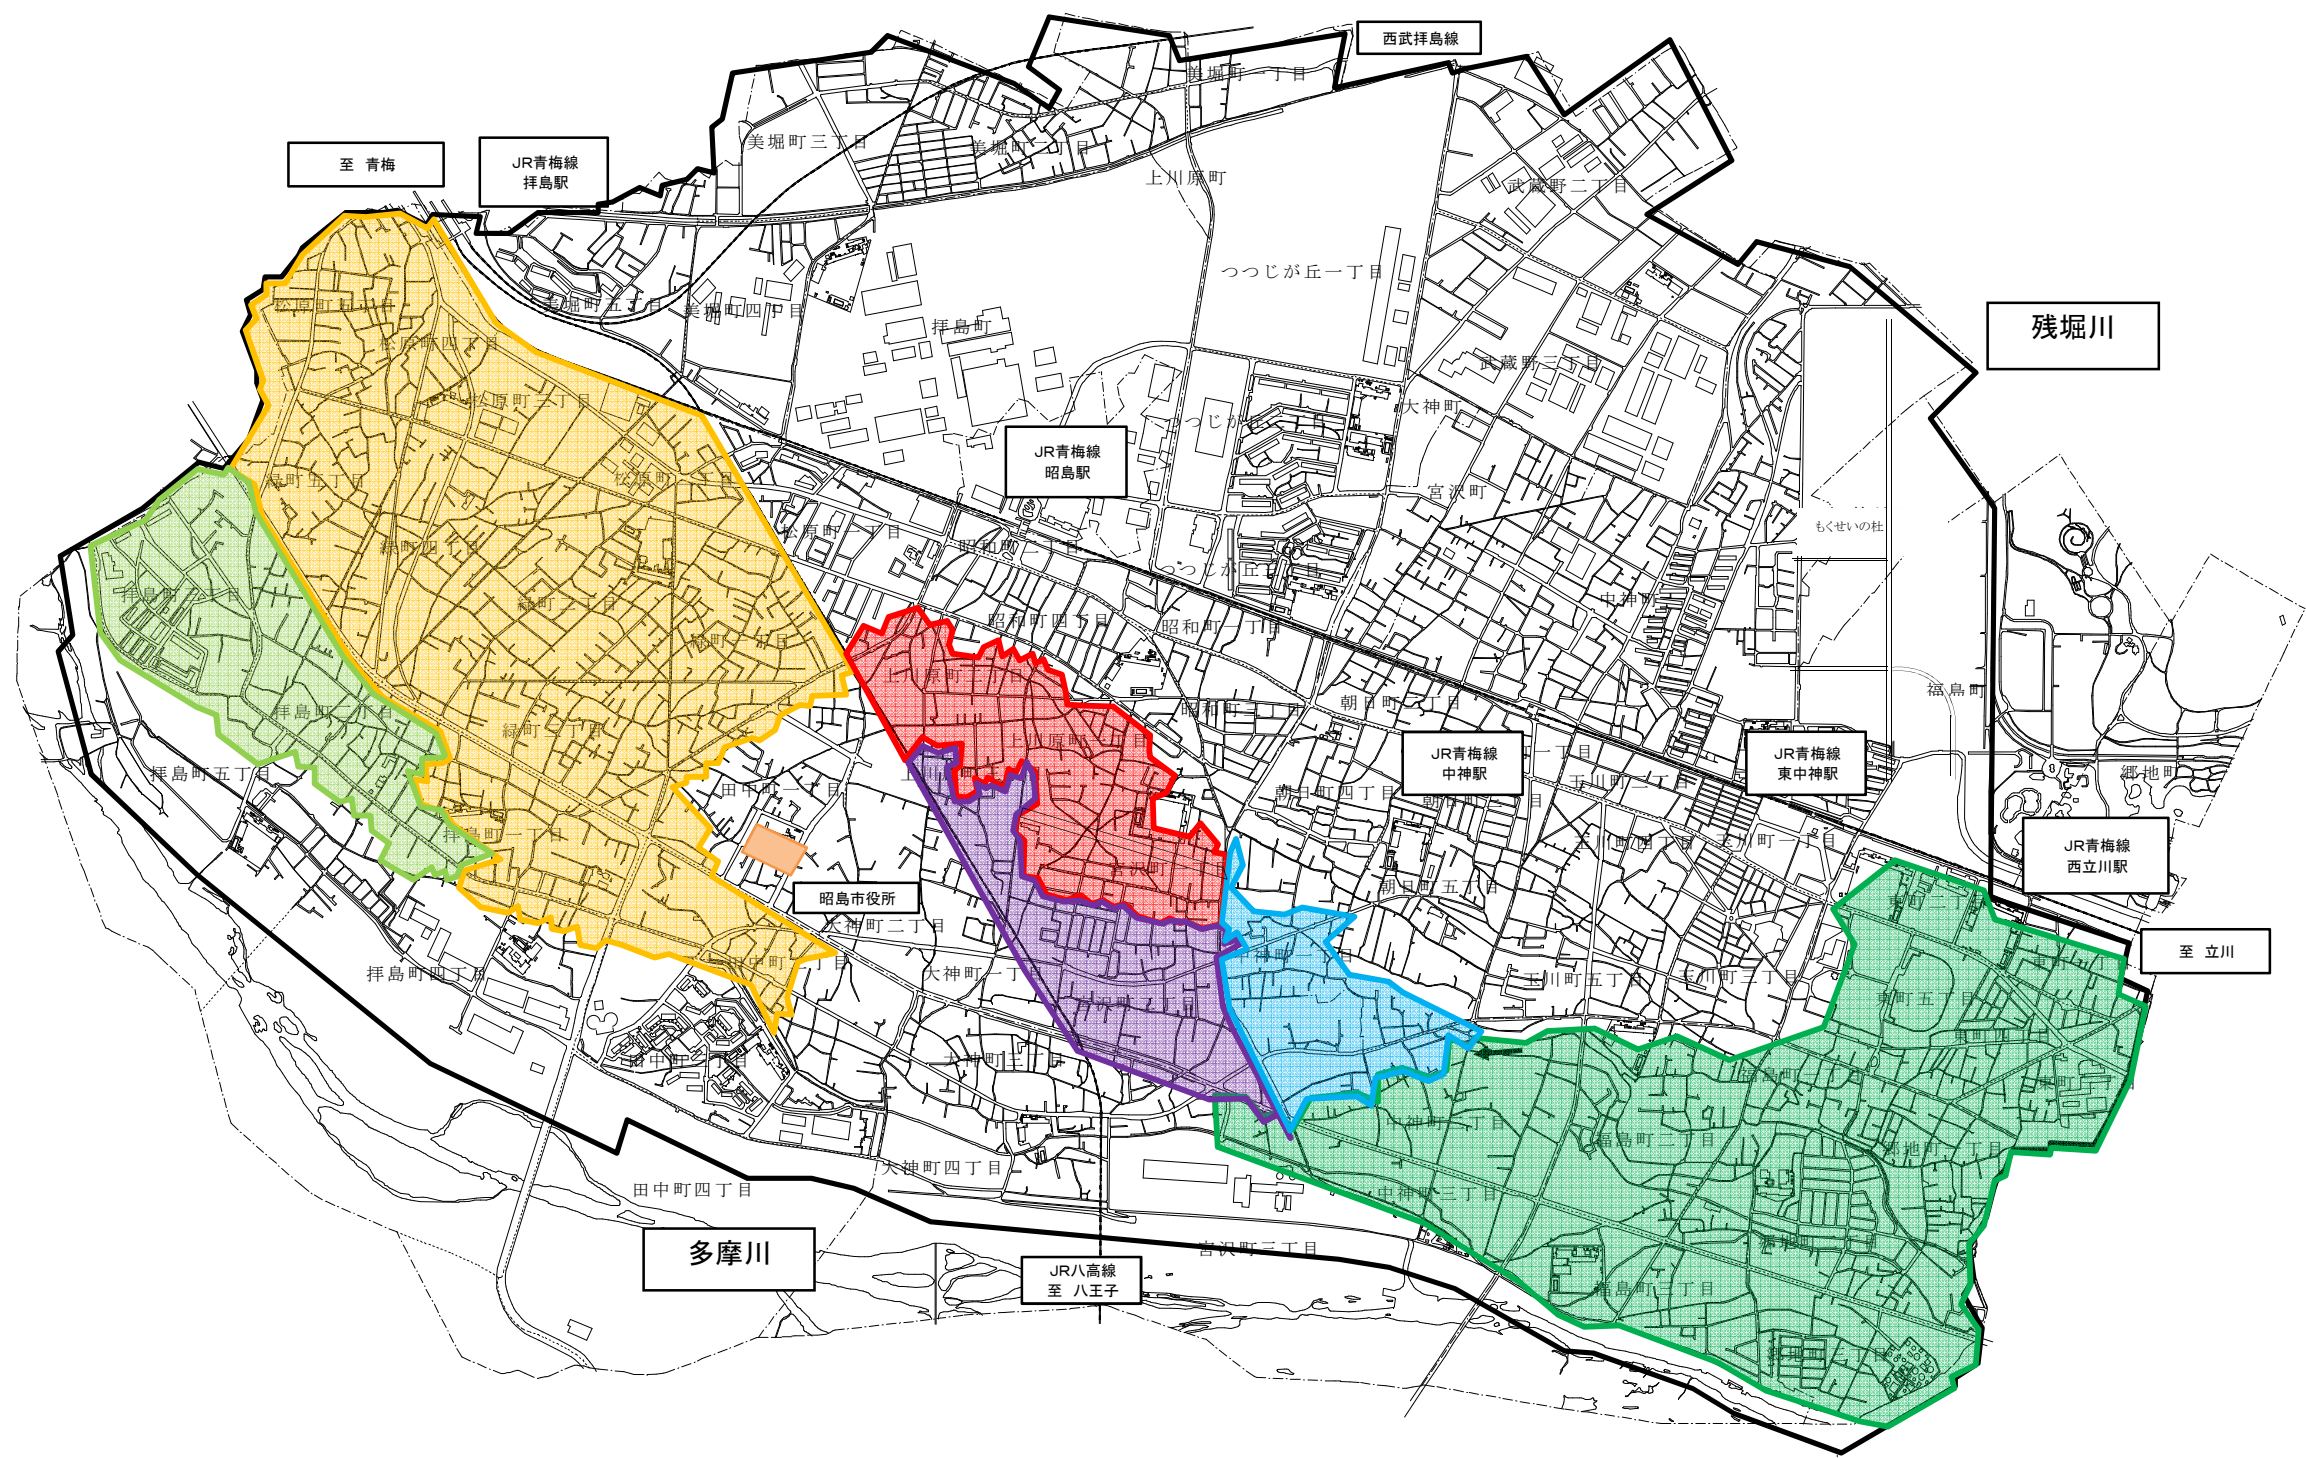

凡例	処理分区	ブロック名	時期
	中部処理分区	サ-21A	R3～R16
	中部処理分区	サ-21'	R8～R13
	南部第1処理分区	郷地P	R7～R18
	中部処理分区	サ-21C	R14～R20
	西部第2処理分区	タ-14	R14～R25
	西部第1処理分区	タ-13-1	R21～R27

発生源対策スケジュール(案)

優先度	処理分区	ブロック名	面積(ha)	作業項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27
				汚水管浸入水対策計画					策定										見直し										評価
1	中部処理分区	サ-21A	38.1	追加調査						水位計 暗視カメラ																			
				詳細調査							送煙 宅内誤接合																		
				計画策定									計画策定																
				基本及び詳細設計										設計															
				対策工事	管更生										人孔更生、取付管更生等														
				効果測定	流量計測 (事前、効果測定)													流量計測 (効果測定)											
2	中部処理分区	サ-21'	22.7	対策工事						管更生																			
				効果測定						流量計測 (事前、効果測定)																			
3	南部第1処理分区	郷地P	186.9	絞込み調査 1次調査					水位計																				
				絞込み調査 2次調査						暗視カメラ																			
				詳細調査						送煙、宅内誤接合、TVカメラ																			
				計画策定									計画策定																
				基本及び詳細設計										設計															
				工事											管更生、人孔更生、取付管更生等														
				効果測定											流量計測 (事前、効果測定)														
4	中部処理分区	サ-21C	34.6	絞込み調査 1次調査																									
				絞込み調査 2次調査												水位計 暗視カメラ													
				詳細調査													送煙、宅内誤接合 TVカメラ												
				計画策定														計画策定											
				基本及び詳細設計															設計										
				工事																管更生、人孔更生 取付管更生等									
				効果測定																流量計測 (事前、効果測定)									

1. 汚水管浸入水対策計画は、10年目に見直し、20年目に評価を実施することを想定している。(※事業の進捗状況により判断する。)
2. 上表のスケジュール及び作業項目は想定であり、調査結果に基づいて見直しを行う。

発生源対策スケジュール(案)

優先 度	処理分区	ブロック 名	面積 (ha)	作業項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27
				汚水管浸入水対策計画					策定										見直し										評価
5	西部第2処理分区	タ-14	184.7ha	絞込み調査 1次調査												水位計													
				絞込み調査 2次調査													水位計 暗視カメラ												
				詳細調査													送煙、宅内誤接合 TVカメラ												
				計画策定															計画策定										
				基本及び詳細設計																設計									
				工事																	管更生、人孔更生、取付管更生等								
				効果測定																	流量計測 (事前、効果測定)								
6	西部第1処理分区	タ-13-1	47.1	絞込み調査 1次調査																									
				絞込み調査 2次調査																			水位計 暗視カメラ						
				詳細調査																				送煙、宅内誤接合 TVカメラ					
				計画策定																					計画策定				
				基本及び詳細設計																						設計			
				工事																							管更生、人孔更生 取付管更生等		
				効果測定																							流量計測 (事前、効果測定)		

1. 汚水管浸入水対策計画は、10年目に見直し、20年目に評価を実施することを想定している。(※事業の進捗状況により判断する。)
2. 上表のスケジュール及び作業項目は想定であり、調査結果に基づいて見直しを行う。
